

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Informe Mensual de Gestión Ambiental

emgesa

Julio de 2015

Contenido

	Pag
1. Biótico	3
2. Físico	12
3. Infraestructura	24
4. Socio Económico	38
Altamira	41
El Agrado	46
Garzón	52
Gigante	57
Autoridades Empleo	63

emgesa

1

Biótico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Restauración BST

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan:

Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

El Plan Piloto de restauración se está dando a conocer a la comunidad a través del programa de divulgación y comunicación de las actividades del proyecto a la comunidad. Adicionalmente el programa de divulgación involucra una articulación social que es indispensable para el óptimo funcionamiento del área de compensación biótica del PHEQ entendida como un territorio destinado a la conservación que debe tener una sostenibilidad social en el largo plazo.

La estrategia de divulgación busca que las comunidades e instituciones de los municipios de El Agrado, Garzón, Gigante y Paicol generen estrechos vínculos con la zona de compensación biótica. De igual manera, que sean parte activa de la reinterpretación y transformación de ese territorio, de tal manera que reconozcan los beneficios colectivos que generan la recuperación y la conservación de la biodiversidad.



3. Principales logros alcanzados

La estrategia del programa de divulgación incluye actividades como: talleres de socialización, recorridos y visitas guiadas, capacitaciones y socialización de avances de resultados. Adicionalmente, se manejan los siguientes canales de comunicación para divulgar el proyecto: Canales impresos (Folletos y cartillas, afiches, prensa vallas); Canales Audiovisuales (Televisión, radio), Canales de redes sociales (Youtube, Facebook, twitter) entre otros.

4. Indicadores

ACTIVIDAD	NUMERO DE ACTIVIDADES	NO. PARTICIPANTES	CANAL DE COMUNICACIÓN	NUMERO
Socializaciones a comunidad y autoridades	10	95	Folletos	1
			Programas de Radio	13
			Boletín informativo	5
			Publicaciones en Pagina WEB	5
Visitas guiadas	14	184	Periodico	3
Capacitaciones	4	60	Programas de TV	4

Análisis de indicador:

A través de la comunicación constante con las comunidades, tanto a nivel local como regional y nacional, se espera promover el empoderamiento ambiental en la región a través de la comunidad que participe en las socializaciones de tal forma que se puedan crear alianzas con las instituciones educativas, de investigación, y de gestión local. Además, se espera integrar el conocimiento local a las estrategias de restauración y fomentar que los trabajadores sean multiplicadores de la experiencia.

ANEXOS



1. Grabaciones de videos informativos sobre el Plan Piloto de Restauración
2. Capacitaciones sobre accidentes ofídicos en el vivero



3. Visitas de la comunidad al vivero Finlandia

Control Macrófitas

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Control y manejo de macrófitas en las áreas de Bengala, Veracruz, Barzal y la quebrada Buenavista. En inmediaciones de la quebrada La Yaguilga, se identificaron tres puntos con la presencia de *Cyperus* sp., *Hydrocotyle ranunculoides* (sombrero de agua) y *Pistia stratiotes* (lechuga de agua).


En la quebrada Buenavista se registró *Eichornia crassipes* (jacinto de agua) y un alga filamentosa aún sin identificar. Construcción de cinco camas de secado, mediante exposición al sol, y una zona de deshidratación. para la disposición final:: ocho fosas, cada una de 2 m de ancho X 4 m largo y 1,20 m de alto y capacidad de 9,6 m³.



3. Principales logros alcanzados

Registro de seis especies de macrófitas acuáticas en el embalse, pertenecientes a cuatro familias. Las especies reportadas presentan un amplio rango de distribución geográfica y son catalogadas en su mayoría como especies cosmopolitas. Se extrajo un total de 8.705 kg de biomasa fresca.

4. Indicadores

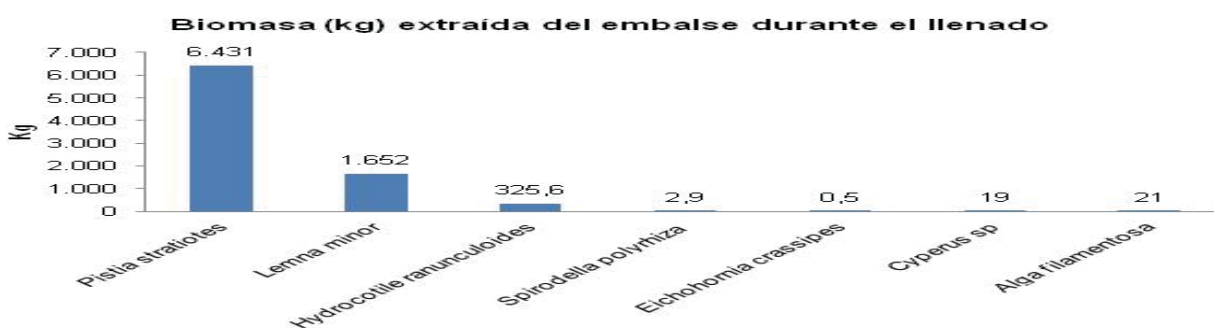

Análisis de indicador:

Zona de Bengala: se extrajeron aprox. 680 kg de de macrófitas; Zona de Veracruz: 75% de la biomasa extraída corresponde a *Pistia stratiotes*, 10% a *Hydrocotyle rannunculoides* al igual que *Spirodela polyrrhiza* y 5% a *Lemna minor*. Zona de Barzal: extracción de 1.600 kg, correspondientes a 2% de *Hydrocotyle ranunculoides* y 98% de biomasa restante de *Pistia stratiotes*.

- En la quebrada Buenavista predominó *Pistia stratiotes*, *Lemna minor* y un alga filamentosa representando 85%, 5% y 10% respectivamente de los aproximadamente 210 kg extraídos.

ANEXOS



Retiro de material vegetal flotante. Registro de lechuga de agua (*Pistia stratiotes*) en el embalse.



Pesaje de biomasa de macrófitas extraídas del embalse. Disposición final de biomasa seca de macrófitas.

Manejo de Fauna Silvestre

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Salvamento contingente durante las actividades de aprovechamiento forestal, descope, dimensionado y apilamiento de madera. Manejo de fauna en zona de obras.



Salvamento de fauna en tierra realizando recorridos de ahuyentamiento e inhabilitación de nidos y refugios. Captura por el borde de la zona de inundación en forma de transectos en banda (5-30 metros a lado y lado de los recorridos). Salvamento de fauna acuático, mediante recorridos en lancha. Actividades realizadas durante 24 horas.



3. Principales logros alcanzados

En julio se rescataron 11311 especímenes, pertenecientes a 49 especies de reptiles, 18 especies de mamíferos, 42 especies de aves y 12 especies de anfibios. En zona de obras se registraron 3 reptiles. Ingreso de 25 animales domésticos: 10 gatos, 15 caninos. Se dieron en adopción 16 animales: nueve perros y siete gatos.

4. Indicadores

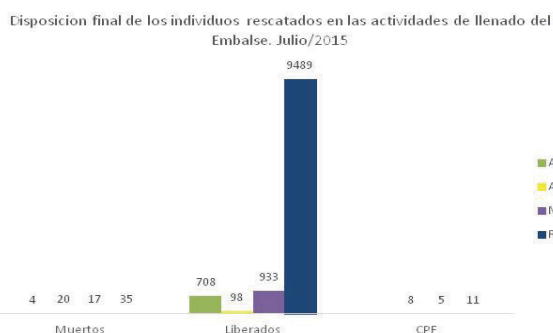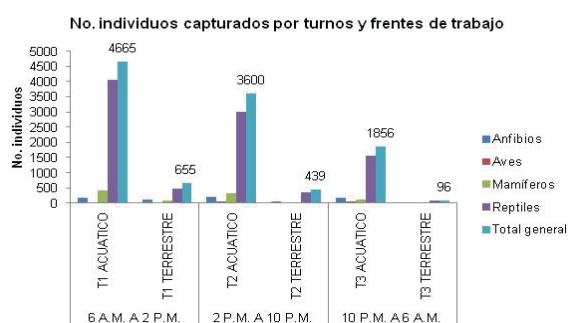

Análisis de indicador:

De los 11311 animales capturados, 11228 fueron liberados, 76 corresponden a individuos fallecidos y 24 ejemplares ingresaron al Centro de Paso Fijo El Tabor (CPF).

ANEXOS



Fauna capturada: conejo (*Sylvilagus brasiliensis*) y culebra (*Oxybelis aeneus*).



Inmovilización de una serpiente (*Martigodryas boddaerti*) que presenta fractura vertebral. Adecuación de una caja de neonato para un búho (*Asio Stygius*) que ingresa para crianza y asistencia nutricional.

Rescate Contingente de Peces

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante este período se realizaron las actividades de rescate contingente de peces durante el llenado del embalse El Quimbo, finalizando el 29 de julio. El rescate de peces se llevó a cabo en las pocetas que se presentaron durante el inicio del llenado, así como en las ya existentes (Zona 9) y en el túnel de desvío.



Conformación de brigadas de rescate de peces en tres turnos de trabajo, y ejecución del Programa de rescate contingente de peces.



3. Principales logros alcanzados

Entre el 30 de junio y el 29 de julio se capturaron 45.703 peces, de los cuales 44.915 (769,5 kg) fueron liberados, siendo el porcentaje de sobrevivencia de 98,28%. Se registraron 788 peces muertos (11,75 kg), con un porcentaje de mortalidad de 1,72%. Después del 29 de julio se continuaron las actividades de monitoreo de las pocetas, realizando rescates cuando ha sido necesario.

4. Indicadores

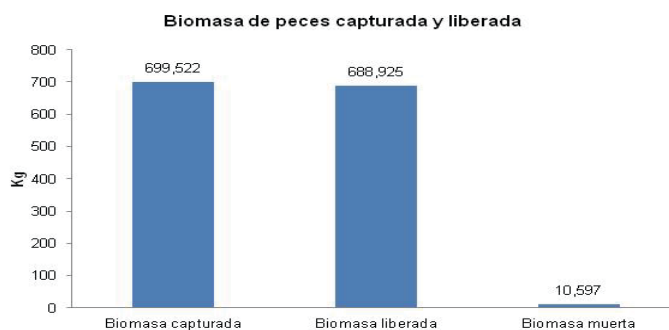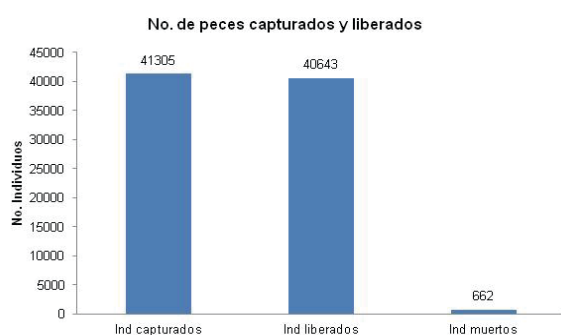

Análisis de indicador:

Captura de 40.643 peces vivos, equivalentes a 688,925 kg y 662 peces muertos, correspondientes a 10,597 kg. Las especies de mayor captura fueron especies con tallas inferiores a los 10 cm, como sardinas pegajosas, sardinas colirojas, sardina cabezona, bebecchicha, cuero, entre otras.

ANEXOS



Fotos 1 y 2. Rescate de peces en el túnel de desvío.



Foto 3. Uso de electropesca en pocetas. Foto 4. Liberación de peces en el río Magdalena.

2

Físico

Excedentes de Excavación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se continuó con la actividad de aprovechamiento de excedentes de excavación en el llenado del Dique Auxiliar y del Muro Parapeto (zona Presa), actividad de excavación en zona de préstamo 19.


Fotografía 1. Extracción de material, acopio temporal colindante a la zona 7.



3. Principales logros alcanzados

Manejo adecuado de los excedentes de excavación, dispuestos en depósitos definitivos, temporales y llenos de obras.

4. Indicadores

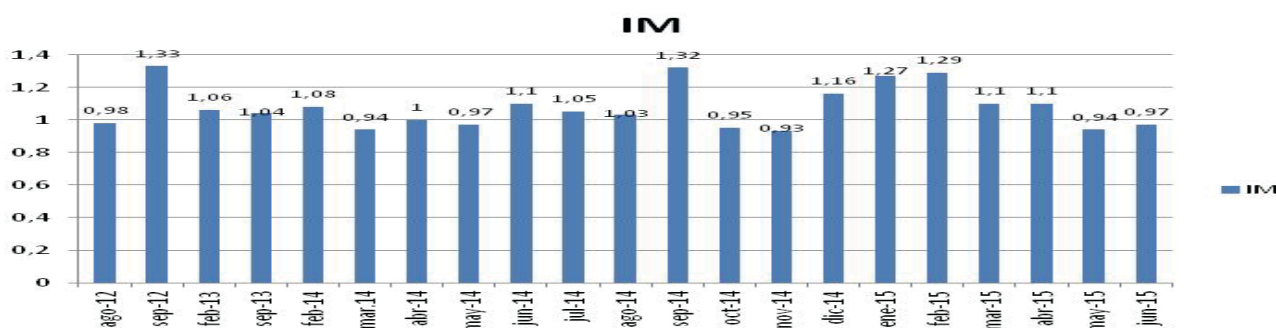

Análisis de indicador:

El valor de este indicador está cerca a la unidad, cuya diferencia corresponde a material utilizado en obras menores como el mantenimiento de vías. Se denota por ello un buen manejo de los materiales extraídos vs materiales en llenos y depósitos.

ANEXOS



Fotografía 1, izquierda. Extracción de material zona Quimbo.
Fotografía 2, derecha. Extracción de material cantera 19.



Fotografía 3. Adecuación canal de descarga del Túnel de Descarga de Fondo.
Fotografía 4. Conformación lleno del dique auxiliar.

Captaciones de Agua

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Fotografía: Punto de Captación Río Páez, corresponde a las coordenadas:

E: 833627 N: 763391

Agua para uso industrial:

- Zona presa: 2,85 L/mes
- Campamento Técnico: 242,36 L/mes
- Río Páez: 38,77 L/mes
- Zona 7: 3,04 L/mes
- Casa de máquinas: No se realizó captación


Los valores reportados corresponden al consumo acumulado en el mes y en la gráfica se presenta el consumo promedio diario de cada uno de los puntos de captación autorizados en la Licencia Ambiental.



3. Principales logros alcanzados

Los caudales de captación se encuentran dentro de los establecidos en la Licencia Ambiental, estos son monitoreados y registrados diariamente para dar cumplimiento a lo autorizado.

4. Indicadores

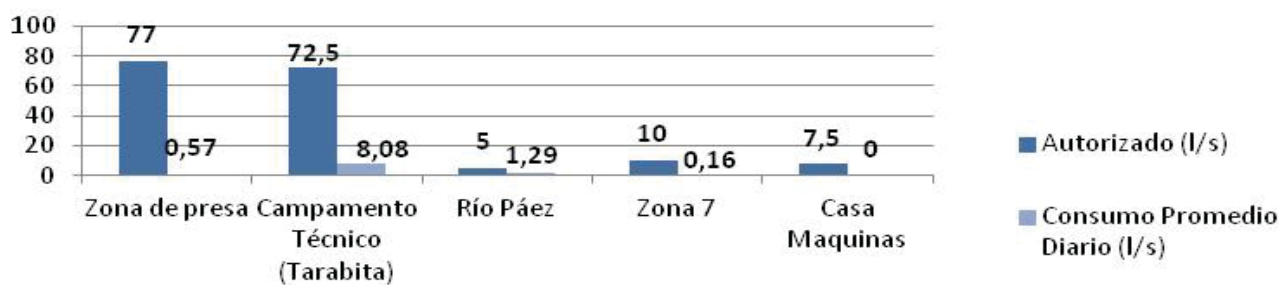

Análisis de indicador:

Cumplimiento de lo autorizado en la Licencia Ambiental, nótese que los valores de los consumos diarios son inferiores a lo autorizado en la Licencia Ambiental.

Manejo del recurso hídrico

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan:

Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Fotografía: Punto de Vertimiento ubicado en las coordenadas: E: 834108 N: 763481. En este lugar se descargan las aguas residuales de zona industrial.

Vertimiento de agua industrial:

- Zona de presa: No se realizan vertimientos
- Zona Industrial: No se realizan vertimientos
- Campamento técnico: 54,40 L/ mes
- Casa de máquinas: No se realizan vertimientos


Los valores reportados corresponden al vertimiento acumulado en el mes y en la gráfica se presenta el vertimiento promedio diario en cada uno de los puntos autorizados en la licencia ambiental.



3. Principales logros alcanzados

Los caudales de vertimiento se encuentran dentro de los establecidos en la Licencia Ambiental, estos son monitoreados y registrados diariamente para dar cumplimiento a lo estipulado.

4. Indicadores

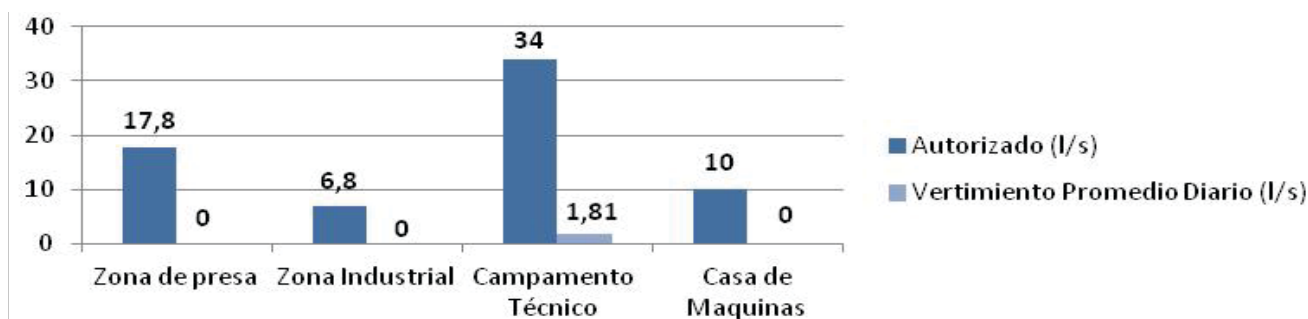

Análisis de indicador:

Cumplimiento de lo autorizado en la Licencia Ambiental, nótese que el valor de los caudales de vertimientos son inferiores a los autorizados.

Manejo de Residuos Sólidos

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Fotografía: Recolección de residuos sólidos en los diferentes frentes de obra. Durante junio se generaron 39,812 Kg de residuos sólidos ordinarios.

Entrega de 1,155 galones de aceites usados a Aceites Juanchito.


Los residuos sólidos convencionales generados en todas las zonas del proyecto son dispuestos en el relleno sanitario Los Angeles e Incihuila. Para junio se reportan los siguientes residuos: convencionales 39,812 kg, 9,434.5 Kg peligrosos y otros peligrosos especiales (canecas metálicas, seis unidades; líquidos contaminados, 1,046 Galones; lámparas, cuatro unidades; pipetas, tres unidades; envases plásticos, 58 unidades; y bidones/isotanques, 16 unidades).



3. Principales logros alcanzados

La cantidad de residuos entregado a Ciudad Limpia e Incihuila en junio fue de 39.812 kg, dicho material es generado en cada una de las zonas activas del proyecto.

4. Indicadores

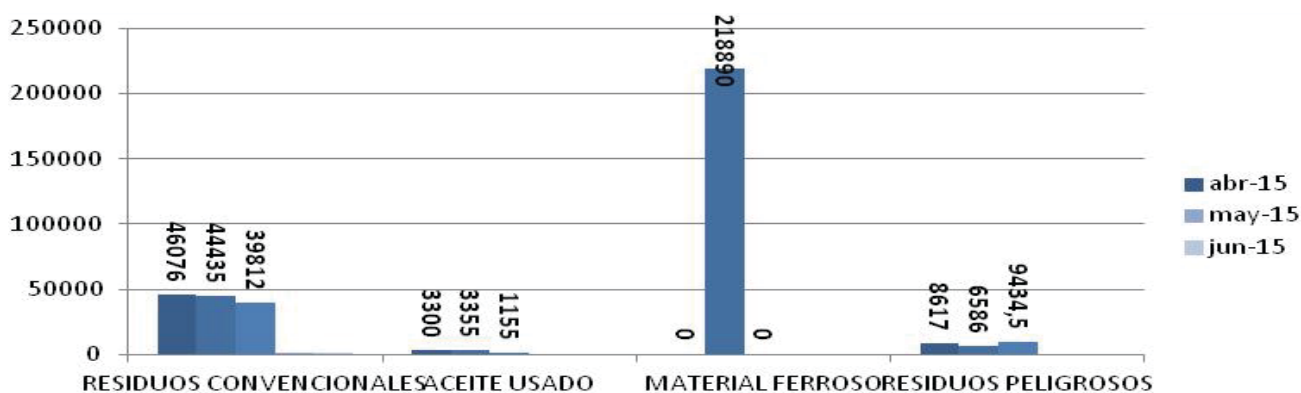

Análisis de indicador:

Se evidencia una disminución en la disposición de residuos convencionales y de aceites usados en el mes a reportar. No se realizó la entrega de materia ferroso al gestor Diaco y se encuentra acumulación en los acopios temporales de los contratistas.

ANEXOS



Fotografía Izquierda: Recolección de material ferroso por parte del gestor externo.
Fotografía Derecha: Recolección de aceites usados por la empresa Aceites Juanchito.



Fotografía izquierda: Recolección de Llantas Usadas por parte del gestor.
Fotografía derecha: Recolección de residuos peligrosos por el gestor externo Incihuil.

Material Particulado

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante este período se continúan realizando las siguientes actividades como medidas para controlar el material particulado:

- 1) Humectación en vías.
- 2) Carpado de volquetas.
- 3) Inspección y seguimiento en la planta de concretos.
- 4) Verificación de los acoples en las mangueras en el proceso de llenado de los silos.

Se continúa con la fase final de desmantelamiento de las estructuras en la planta trituradora.




3. Principales logros alcanzados

Mantener controladas las fuentes de emisión de material particulado en el proyecto hidroeléctrico, sin que se vea afectada la salud de los trabajadores ni el medio ambiente.

4. Indicadores

Volumen de agua utilizada para humectación de vías

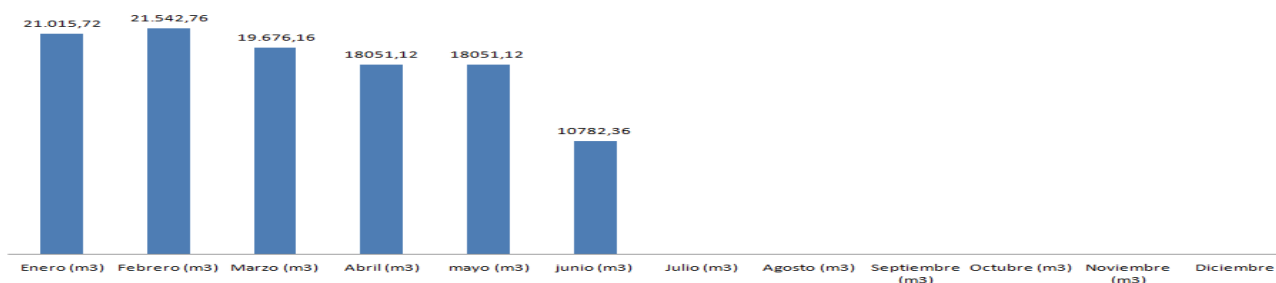

Análisis de indicador:

La gráfica representa el volumen de agua utilizado para humectación de vías durante el periodo de junio de 2015, en el cual se utilizaron 10782,36 metros cúbicos de agua. Para este mes se presenta el menor consumo de agua con respecto a los meses anteriores.

ANEXOS



1) Humectación de vías.



2) Carpado de volquetas.



3) Desmantelamiento planta trituradora.



4) Verificación de acoples llenado silos .

Banco de Suelos

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se continuó con el traslado de material de suelo orgánico del banco de suelos del zodme 18 a la zona del Dique Auxiliar, en el área donde se adelantan las actividades de revegetalización del dique (espaldón aguas abajo). No se presentó conformación de nuevos bancos de suelos.


Fotografía 1: Extracción de capa orgánica del banco de suelos ubicado en el zodme 18, utilizado para la revegetalización del espaldón aguas abajo del dique auxiliar.



3. Principales logros alcanzados

Conformación y conservación de los bancos de suelos para su posterior utilización en la restauración de áreas intervenidas, dando cumplimiento al PMA.

4. Indicadores

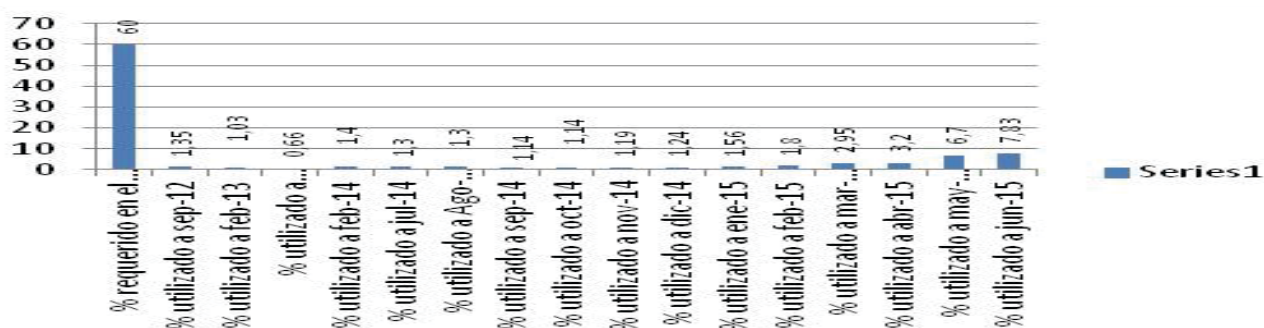

Análisis de indicador:

El indicador de material utilizado con relación a lo conformado en los bancos de suelos tuvo un incremento con respecto al mes anterior, siendo utilizado en la revegetalización del espaldón aguas abajo del dique auxiliar. No se conformaron nuevos bancos de suelos. Se sigue con el indicador por debajo a lo requerido en el PMA, cuyo porcentaje seguirá en aumento principalmente la etapa del plan de abandono.

ANEXOS



“Fotografías 1 y 2. Material del banco de suelos del zodme 18 utilizado en la revegetalización del espaldón aguas abajo del dique auxiliar.



Fotografías 3. Mantenimiento de la señalización en el banco de suelos, sector El Viso.

Manejo de Voladuras

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:


Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Fotografía: esquema de voladura a cielo abierto-zona 19 (12/06/2015)


Posterior a la realización de las voladuras, quedan residuos sobrantes como cordones detonantes, carretes, cartones, tubos y lonas los cuales son recogidos en bolsas rojas y llevados al polvorín para acopiarlos temporalmente allí. Teniendo en cuenta un volumen de material suficiente se hace la gestión correspondiente para su traslado hasta el batallón de Garzón, en donde realizan incineración del respectivo material; dicha actividad es desarrollada por el área especializada en manejo de explosivos.

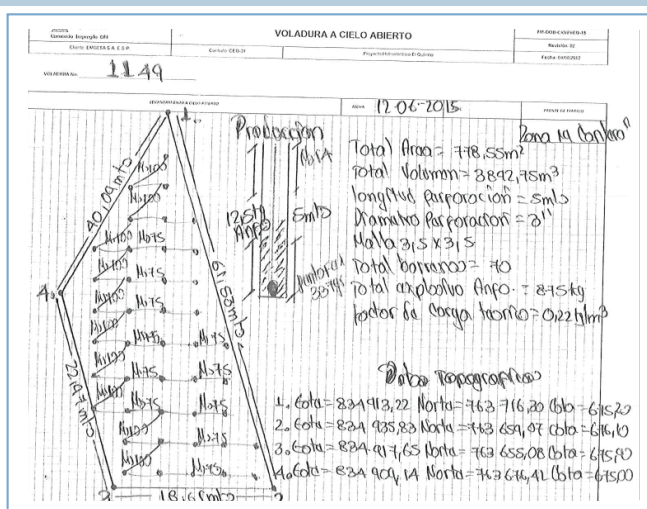

3. Principales logros alcanzados

Cargue y detonación en distintos frentes de obra, teniendo en cuenta un control de proyección de caída de material e implementación de las medidas de seguridad correspondientes para la actividad.
Recolección, almacenamiento y disposición adecuada de los residuos generados en la actividad de voladura.

4. Indicadores

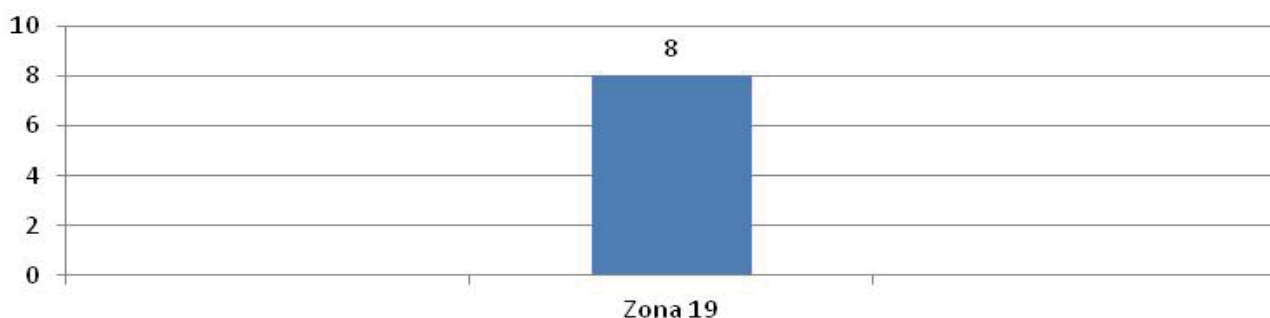

Análisis de indicador:

Se realizaron 8 voladuras las cuales todas fueron a cielo abierto. No se registraron voladuras subterráneas.

3

Infraestructura

Vías Sustitutivas

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Tramos I, II, III y IV

TERMINADOS


“Se finalizaron los planes de abandono de los tramos I y II.
Se continúa con el plan de abandono del tramo III.
Se finaliza la conformación de los zodme de los cuatro tramos de las vías sustitutivas.



3. Principales logros alcanzados

Se da por finalizada la construcción del viaducto Balseadero.

4. Indicadores

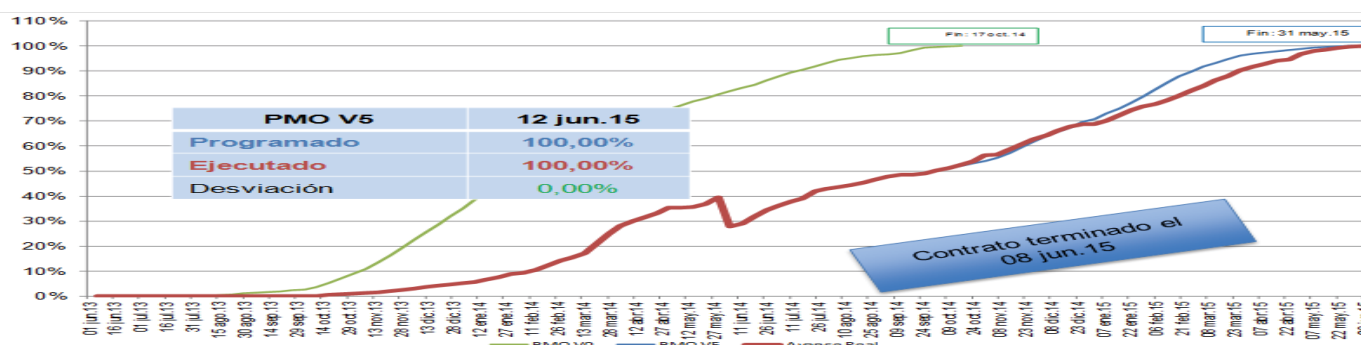

Análisis de indicador:

Vías sustitutivas a 100%

Redes

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:


2. Actividades relevantes realizadas

Escalereta: Desmantelamiento del conductor de media tensión y postes de concreto de 8m y 10m.

Veracruz: Desmantelamiento del conductor de media tensión, de postes de concreto de 8m y 10m y de Transformador 15Kva.

Remolinos: Desmantelamiento de conductor de media tensión y de postes de concreto de 8m y 10m.


- Tramo I, II, III y Llanos de la Virgen: Instalación de nomenclatura en nodos, transformadores y seccionadores.
- Se amplió el objeto del contrato para proceder con las actividades para la iluminación del viaducto Balseadero.

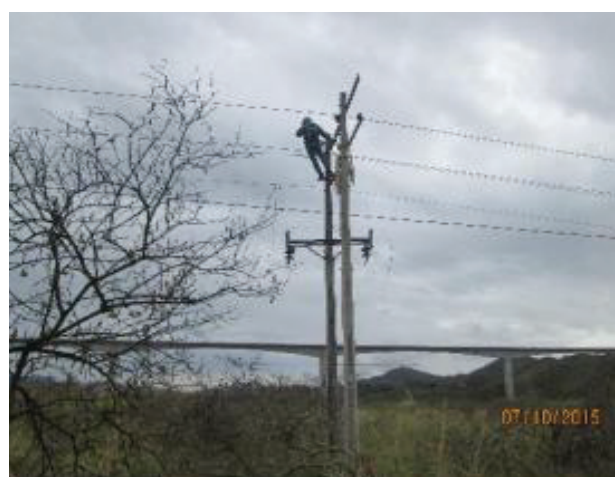

3. Principales logros alcanzados

Durante las actividades de desmantelamiento no se generaron incidentes o accidentes ambiental. Se realizó adecuado manejo de residuos.

4. Indicadores

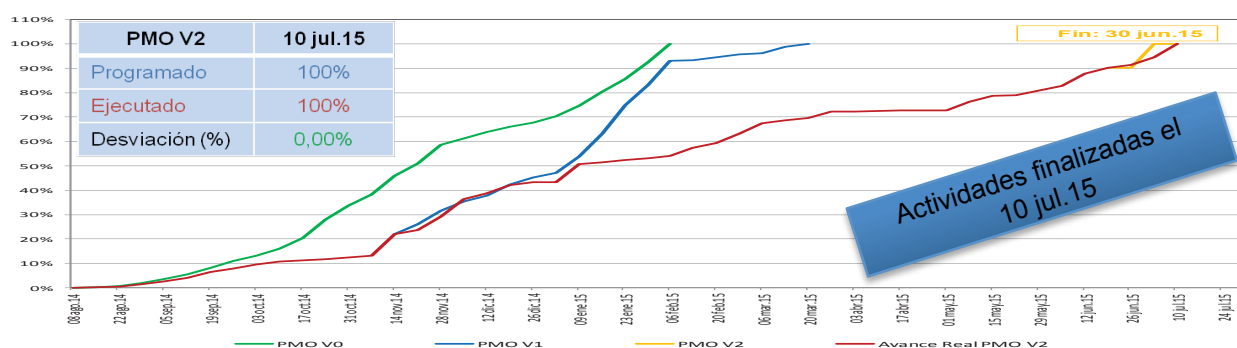

Análisis de indicador:

Se presenta un avance real de 100% de la Reposición y Remoción de Líneas Eléctricas.

ANEXOS



Foto 1. Vereda Veracruz, desmantelamiento de línea de baja tensión.

Foto 2. Vereda La Escalereta, abatida de poste de concreto.

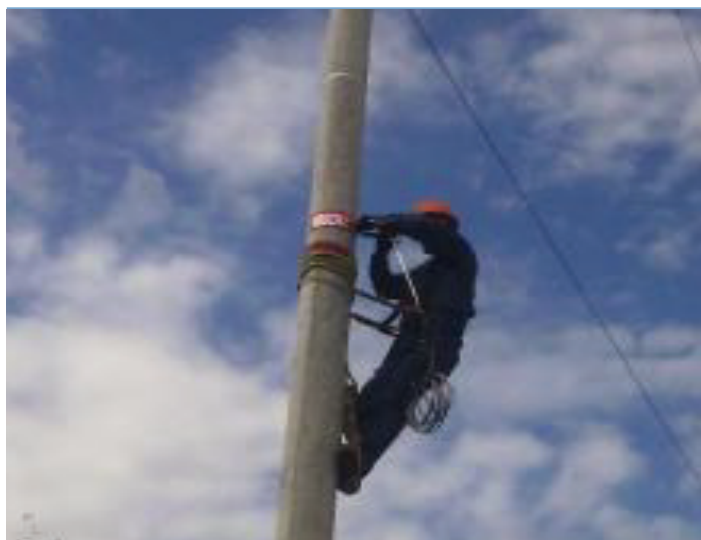


Foto 3. Tramo I, instalación de placa de numeración.

Foto 4. Tramo II, instalación de placa de numeración.

DR Santiago y Palacio

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

En la construcción de las parcelas: Se adelantan obras pendientes de excavación, rellenos, estructura e instalación de válvulas. Se realizan actividades de control topográfico de las vías y retiro de herramienta, equipo y materiales sobrantes.

En la construcción de la conducción del distrito de riego: Se realizaron las actas de vecindad en el sector Brisas de Majo y ajustes en el diseño de la bocatoma y conducción.


En aquellas parcelas en que continúa la construcción, se realiza manejo de material de excavación, manejo de residuos y otros para el manejo ambiental durante las actividades constructivas. Se iniciaron las actividades del plan de abandono para la construcción de las parcelas. Durante las excavaciones en las parcelas no se hallaron hallazgos de valor arqueológico.



3. Principales logros alcanzados

Se inician las actividades que permitan la construcción de las obras de conducción y bocatoma de este distrito de riego. Se adjudica el Contrato CEQ-830 "Construcción de obras complementarias para el distrito de riego Santiago y Palacio del PHEQ" a FERNANDO JIMÉNEZ ROA.

4. Indicadores

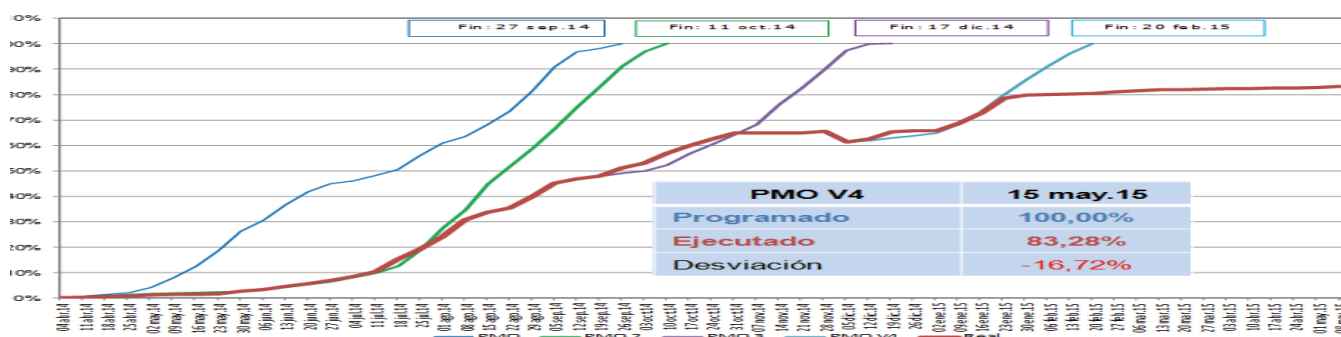

Análisis de indicador:

Se presenta un atraso por el no inicio programado de las actividades de construcción para la conducción y bocatoma del distrito de riego de Santiago y Palacios.

ANEXOS



Foto 1. Vías intraprediales, control topográfico.

Foto 2. Estructuras intraprediales, instalación de tapas.



Foto 3. Distrito de riego, inicio actividades: plan de abandono - parcelación.

Foto 4. Distrito de riego, comité de reasentamiento.

DR Llanos de la Virgen

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Distrito de riego para la comunidad de La Escalereta en Llanos de La Virgen.

Avance de Obras:

Se realizaron actividades de movimiento de tierra en vías (rellenos); instalación de afirmado; construcción de estructuras hidráulicas y de contención; instalación de tubería de red de distribución principal para la parte alta; instalación de tubería; construcción de cajillas y realización de pruebas hidrostáticas correspondientes a la adecuación intrapredial de parcelas socios fundadores.

A 31 de julio, en los avances de arqueología se encuentran 173 zonas restringidas, en el siguiente cuadro se observa las restricciones en 10 parcelas y 1 en el eje 5, de las cuales 4 son de socios fundadores. Durante julio de 2015 se liberaron las parcelas 78, P, 67, 72, 116 y 80.




3. Principales logros alcanzados

El 27 de julio de 2015 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió el Auto 287 por el cual se requirió información adicional ante la solicitud de levantamiento de veda de epifitas, otorgan un plazo de 45 días para la entrega de información.

En este frente de obra se realiza el manejo adecuado de residuos, humectación de vías para el manejo del material particulado y demás medidas de manejo ambiental.

4. Indicadores

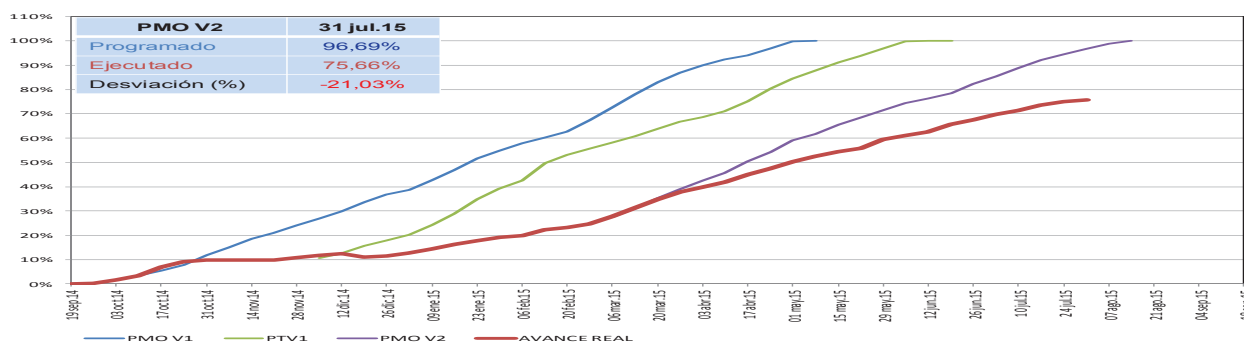

Análisis de indicador:

De acuerdo al seguimiento realizado al programa, con corte a 31 de julio de 2015, se presenta un avance de 75,66%.

ANEXOS



Foto 1. Parcela 57 Reservorio parte alta, se realizó figurado, armado de acero de refuerzo y hormigonado de los pedestales disipadores de energía y muros laterales pertenecientes al primer módulo de la estructura de rebose del vertedero. Foto 2. Parcelas 18,19,20,21 Parte alta, construcción de cajas de toma predial en concreto de 28 Mpa.



Foto 3. Eje de vía No 2, alcantarilla en 24", armado de acero de refuerzo y hormigonado de estructura de entrada, salida y losa superior en concreto. Foto 4. Ramal principal en tubería PVC de 20" y 24", instalación en tubería PVC de 24" entre abscisas K0+454 al K0+500, de 20" entre abscisas K0+560 al K0+644.

DR Montea

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Distrito de riego para la comunidad de Veracruz en Montea.
Avance de Obras:

Construcción de bases y muros en concreto reforzado para bocatoma; rellenos en material seleccionado para desarenador; instalación de tubería de red de conducción; construcción de estribos y anclajes de cables en concreto reforzado para viaducto; movimiento de tierra (excavación, relleno y afirmado) y obras hidráulicas y de contención para vías; instalación de tubería y parcelación de la parte alta de la red intrapredial.

El 27 de julio de 2015 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió el Auto 287 por el cual se requirió información adicional ante la solicitud de levantamiento de veda de epifitas, otorgan un plazo de 45 días para la entrega de información.




3. Principales logros alcanzados

Se continúa con el manejo ambiental en el frente de obra, con el adecuado manejo de residuos, irrigación de vías, manejo de material particulado por medio de humectación de vías y control de velocidad de vehículos.

A 31 de julio no se encuentran zonas restringidas por hallazgos arqueológicos

4. Indicadores

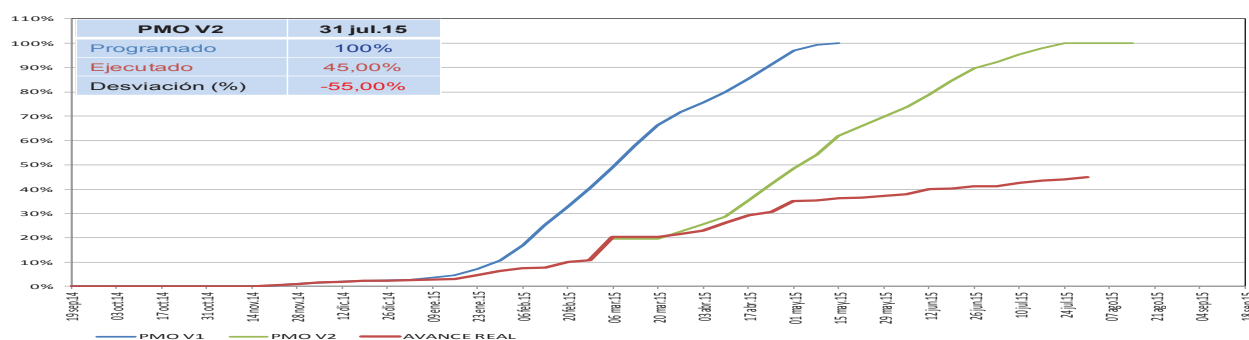

Análisis de indicador:

De acuerdo al seguimiento realizado al programa, con corte a 31 de julio de 2015, se presenta un avance de 45,00%.

ANEXOS



Foto 1. Via eje N°1 box - couvert, se finalizó la estructura. Foto 2. Parcelacion, continuó la instalacion de tuberia en las parcelas 1 y 7.



Foto 3. Alineamiento de conducción, atraques en concreto de las curvas instaladas. Foto 4. alineamiento de conducción, lleno protección de tubería tramo de la k1+100 - k1+150.

DR La Galda

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Distrito de riego para la comunidad de San José de Belén - La Galda.

Avance de Obras:

Se realizaron actividades de movimiento de tierra en vías (descapote, excavación, relleno y afirmado); construcción y adecuación de canales; instalación de geomembrana; construcción de estructuras (alcantarillas y cajas); y parcelación (construcción de canales de riego y drenaje interno, cajas de control y derivación, caída vertical, estructura de entrega y toma predial).

El 27 de julio de 2015 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió el Auto 287 por el cual se requirió información adicional ante la solicitud de levantamiento de veda de epifitas, otorgan un plazo de 45 días para la entrega de información. El 6 de julio se realizó la visita técnica por parte de la CAM para la concesión de agua para el distrito de riego. Se está a la espera del acto administrativo.




3. Principales logros alcanzados

Se continúa con el manejo ambiental en el frente de obra, con el adecuado manejo de residuos, irrigación de vías, manejo de material particulado por medio de humectación de vías y control de velocidad de vehículos.

A 31 de julio, en los avances de arqueología se destaca que se encuentran dos puntos restringidos en la parcela 17 en los cuales se están desarrollando labores de excavación.

4. Indicadores

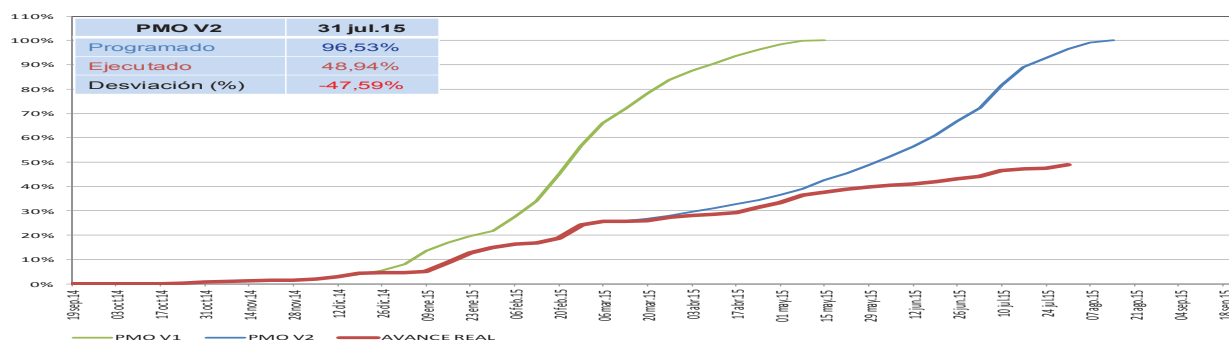

Análisis de indicador:

De acuerdo al seguimiento realizado al programa, con corte a 31 de julio de 2015, se presenta un avance de 48,94%.

ANEXOS



Foto 1. Parcela 1, construcción de enrocado en el encole y descole de la estructura de control y derivación simple de la abscisa K0+390. Foto 2. Canal de riego N° 1, Construcción de enrocado sobre talud del costado izquierdo y derecho entre las abscisas K0+145 al K0+155.



Foto 3. Canal de drenaje N° 4, instalación de acero y vaciado de placa de fondo del costado izquierdo de la alcantarilla de acceso predial, ubicada en la abscisa K0+593. Foto 4. Canal de riego N° 3, relleno con material seleccionado de la excavación para realce del canal de riego entre las abscisas K0+190 al K0+347.

DR Llanos de la Virgen

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Para la construcción de la conducción del distrito de riego de Llanos de La Virgen, en este período, se realizaron obras complementarias (anclajes y protección de tubería) en concreto. Se continúa con las actividades de excavación, instalación de tubería y rellenos en el sector de Rancho Espinal y sector de tubería enterada después del viaducto. Se adelanta también la construcción de gaviones para pasos especiales; y toma de densidades para control de calidad.


El 27 de julio de 2015 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió el Auto 287 por el cual se requirió información adicional ante la solicitud de levantamiento de veda de epifitas, otorgan un plazo de 45 días para la entrega de información.



3. Principales logros alcanzados

Se continúa con la implementación de medidas de manejo ambiental, manejo de residuos, material de excavación, recurso hídrico, entre otras. Durante este período no se identificaron zonas con hallazgos arqueológicos

4. Indicadores

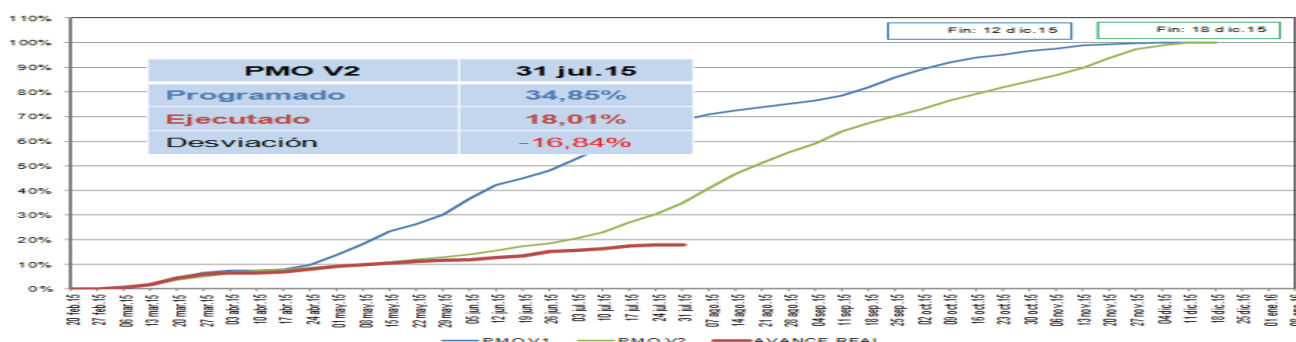

Análisis de indicador:

De acuerdo al seguimiento realizado al programa, con corte a 31 de julio de 2015, se presenta un avance de 18,01%.

ANEXOS



Foto 1. K7+644, anclajes de tubería. Foto 2. k7+420 a k7+394, construcción de paso especial.



Foto 3. K7+561 al K7+574, encofrados de tubería. Foto 4. K8+050, acero de refuerzo para anclaje.

4

Socio Económico

Reasentamiento de población

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

En cuanto a PPA firmados y concertados: 147 PPA :24 en Santiago y Palacio, de los cuales 1 PPA inició (Oliva Fernandez); Llanos de la Virgen, 11 (reubicación) 38 (reasentamiento)]; 19 en Montea, 16 en la Galda y 15 PPA concertados de reasentamiento individual en Llanos de la Virgen. Además, 24 de las familias reasentadas individualmente: 14 en Gigante, 9 en Garzon y 1 Agrado. *58 visitas de asistencia técnica, a 18 familias de reasentamiento individual y una de reasentamiento colectivo, realizadas por parte del Operador Social -SOCYA.

En los predios de reasentamiento individual se reporta producción agropecuaria con cultivos de café, cacao, plátano, ganadería doble propósito, huevos de gallina y de codorniz, limón, mandarina, piña y leche. Además de los volúmenes de venta, se suman las cantidades que se usan para el autoconsumo de especies de pancoger. Igualmente se reporta el Negocio de pan casero producto del PPC de la familia del señor Tito Perdomo Tapiero.




Parcela No 21 , Proyecto - Produccion de huevos de Codorniz reasentamiento individual - Llanos de La Virgen - Hernan Tovar.

3. Principales logros alcanzados

A la fecha, 13 familias han alcanzado su indicador de estado: siete en el municipio de Gigante, cuatro en el municipio de Garzón, una en el municipio de El Agrado y una en el municipio de Altamira. Frente a cierres de PPA se han suscrito cinco actas: cuatro en el municipio de Garzón (Virginia Mayorca, Luis Fernando Sánchez, Napoleón Sánchez, Amelia Velez Peña) y una en el municipio de Garzón (Tito Perdomo Tapiero).

4. Indicadores

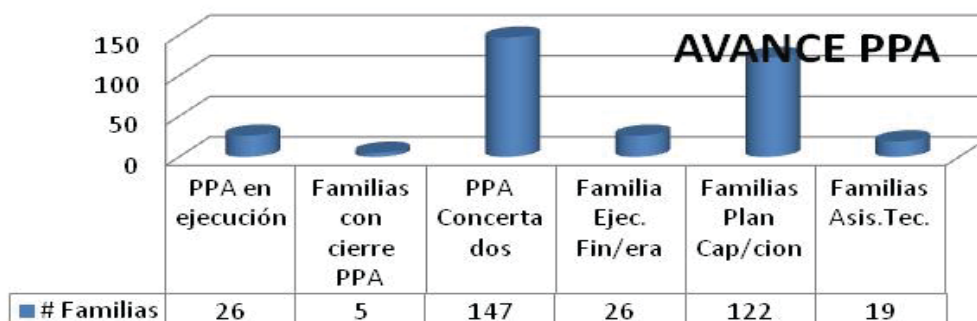

Análisis de indicador:

- En total 26 Familias con PPA en ejecución, se han realizado cinco actas de cierre de PPA.
- Se han concertado 147 Planes de Producción Agropecuarios: 49 del reasentamiento colectivo de Llanos de la Virgen, 24 del reasentamiento Santiago y Palacio, 19 Montea, 16 en la Galda y 39 de reasentamiento individual, de los cuales 15 pertenecen a Llanos de La Virgen.

ANEXOS



Fotografía Izquierda: Predio La Palmita, vereda La Guandinosa, municipio de Gigante, desarrollo del cultivo de piña dentro del proceso de implementación de su PPA. Fotografía Derecha: Predio Corinto 1, vereda Pueblo Nuevo, municipio de Gigante - Familia de la señora Amelia Vélez - manejo de pasto de corte para complemento alimenticio del ganado.



Fotografía Izquierda: Predio La Esperanza, vereda La Guandinosa, municipio de Gigante- Familia del señor Luis Alfonso Garcés, revisión técnica del cultivo de plátano. Fotografía Derecha: Parcela 16 asignada a la señora Oliva Fernández en el reasentamiento colectivo Santiago y Palacio. Establecimiento del cultivo de piña dentro la implementación de su PPA.

emgesa

Altamira

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y divulgación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se realizaron 8 eventos en el marco del Plan de gestión social, en los que participaron 217 personas de las 278 convocadas. Los eventos ejecutados corresponden a actividades realizadas en el marco de los proyectos de Restablecimiento del Tejido Social, Educación Ambiental y consulta y concertación.


Se realizó la emisión de un boletín informativo anual por la página web del proyecto dirigido a actores regionales y Nacionales. Se emitieron 10 capsulas informativas del programa La Buena Energía de El Quimbo, dirigidos a actores locales, puntuales y comunidad en general. Se realizó la emisión de un programa de televisión La Buena Energía de El Quimbo



3. Principales logros alcanzados

por el canal regional Nación TV, dirigido a públicos de interés de carácter regional y local, comunidad en general. Se emitieron tres comunicados de prensa a través de medios de comunicación regionales, página web del proyecto dirigido a la comunidad en general y se llevó a cabo la distribución de ejemplares del periódico La Buena Energía de El Quimbo.

4. Indicadores

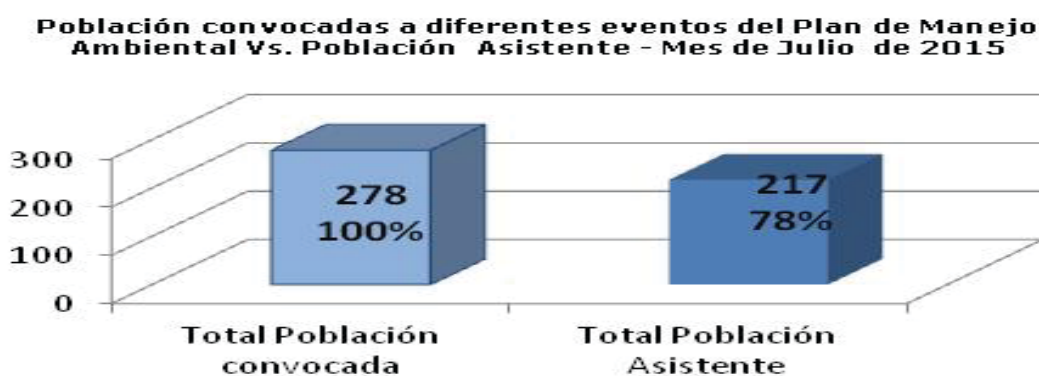

Análisis de indicador:

En los 8 eventos realizados en el municipio de Altamira se logró un nivel de participación de 78% sobre la población convocada.

Consulta y Concertación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante julio se llevaron a cabo dos comités de reasentamiento con la comunidad de La Escalereta, trasladada a la vereda Villa Fernanda del municipio de Altamira.


Los temas abordados durante los comités de reasentamientos fueron los avances del Distrito de Riego, tanto del intrapredial como de la conducción. Otros temas abordados fueron sobre el avance en la conformación de la nueva Junta de Acción Comunal y la disolución de la anterior.



3. Principales logros alcanzados

Se brindó información general del obras de infraestructura comunitaria con un cumplimiento de 99.56%. Por solicitud de la comunidad, el 19 de julio se realizó un recorrido de campo para verificar los avances de la conducción del intrapredial. Esta actividad contó con una asistencia de cinco representantes de la comunidad, logrando exponer inquietudes que fueron resueltas.

4. Indicadores

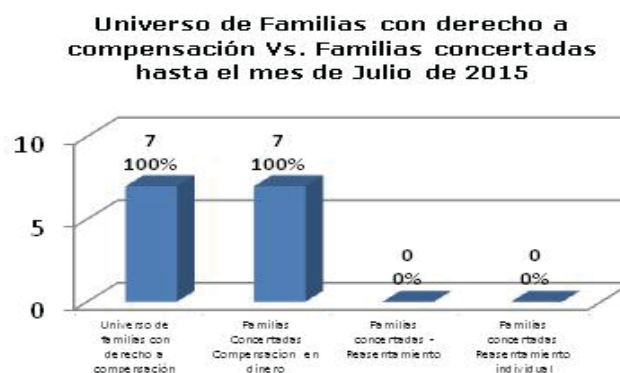

Análisis de indicador:

Durante julio se continuaron las actividades para la implementación del plan de acción, aprobado por el Comité, para el reasentamiento de las familias trasladadas. Se tuvo una participación del 90% de las familias convocadas.

Tejido Social

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se realizaron diferentes actividades en el marco del proyecto de restablecimiento del tejido social: se cerró el proceso de terapias de grupo con los jóvenes del reasentamiento Llanos de la Virgen, realizando dos sesiones. En la actividad denominada "Festival por mis ancestros" se logró que asistieran a este ejercicio 15 personas, 60% corresponde a población mayor, 30% adultos y 10% a infantil y juvenil. Esta comunidad resaltó de manera significativa la labor de las parteras, el sobandero, entre otros.

Se continuó con el proceso de disolución y liquidación de la Junta de Acción Comunal, desarrollando todas las acciones que ello implica, como lo son anuncios en periódico nacional. Así mismo con la tesorería, la presidencia y el fiscal de la JAC, se organizó el libro de ingresos y egresos, insumo que se presentó ante el contador público para la elaboración del balance financiero; el cual se reportó en ceros. Se realizó taller de cartografía social con líderes




3. Principales logros alcanzados

de las familias trasladadas a Llanos de la Virgen, para hacer un diagnóstico rápido participativo, con el fin de conocer la visión de comunidad frente al reasentamiento, la comunidad receptora y las debilidades y fortalezas a nivel organizativo. Se ha logrado recibir asesoría del Incoder en la conformación de una nueva asociación, debido a los cambios que han surgido en el reasentamiento, como son el cambio de municipio y el ingreso de usuarios nuevos a la comunidad

4. Indicadores

Talleres Programados Vs Talleres ejecutados Programa de restablecimiento del Tejido social Julio de 2015

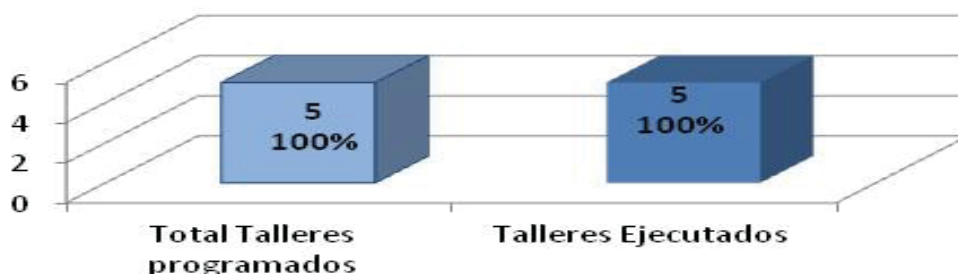

Análisis de indicador:

Se logró una participación de 100% de las personas convocadas a las actividades desarrolladas en el marco del proyecto de restablecimiento del tejido social, las cuales se desarrollaron en su mayoría con las familias trasladadas y residentes actualmente en el reasentamiento de Llanos de la Virgen.

Acompañamiento y Asesoría

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

En la etapa de post traslado se llevaron a cabo cinco visitas psicosociales, 11 actividades colectivas y dos gestiones de acompañamiento psicosocial. Se continuó con el desarrollo de visitas de acompañamiento psicosocial a las familias trasladadas al nuevo espacio, se pretendió con esta actividad fortalecer los vínculos y las relaciones al interior de los hogares, evitando la presencia de posibles fracturas relacionales, que están sujetas a cambios vividos en la etapa de adaptación al nuevo territorio.


Se realizó el taller sobre “Diagnóstico comunitario y cartografía social” con una asistencia de 11 líderes de La Escalereta y una reunión de “Asambleas de elección de dignatarios y aprobación de estatutos para la conformación de la asociación de usuarios de Llanos de la Virgen” contando con una asistencia de 40 representantes de las parcelas y futuros usuarios para el distrito de riego.



3. Principales logros alcanzados

Se logró realizar en articulación con el área económica las capacitaciones en “Manejo de la economía familiar”, “Manejo y uso de patios”, con una participación de 30 personas y la de “Elaboración de composteras y adaptación al nuevo entorno” con una asistencia de nueve representantes de las familias. Las actividades fueron desarrolladas a partir de reflexiones para la vida.

4. Indicadores

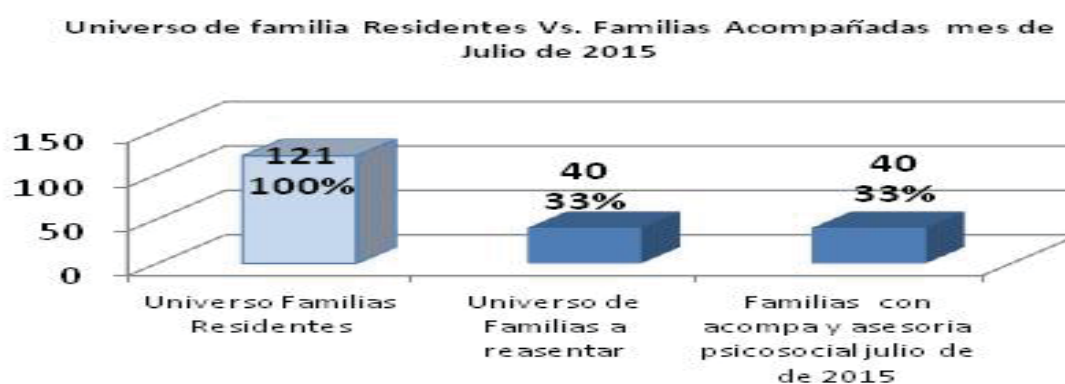

Análisis de indicador:

De las 121 familias que residían en la Escalereta, 73 tenían derecho al programa de reasentamiento, sin embargo 40 optaron por el reasentamiento colectivo, encontrándose a la fecha 100% de esta comunidad trasladada al reasentamiento de Llanos de la Virgen en el municipio de Altamira.

emgesa

El Agrado

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y Divulgación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se realizaron 14 eventos en el marco del Plan de Gestión Social, en los que participaron 209 personas de las 185 convocadas. Los eventos que se llevaron a cabo se realizaron en el marco de los proyectos de restablecimiento del tejido social, educación ambiental y saneamiento básico. Adicionalmente se llevó a cabo la socialización del llenado del embalse con comunidades y autoridades municipales.

Se realizó la emisión de un boletín informativo anual por la página web del proyecto dirigido a actores regionales y Nacionales. Se emitieron 10 capsulas informativas del programa La Buena Energía de El Quimbo, dirigidos a actores locales, puntuales y comunidad en general. Se realizó la emisión de un programa de televisión La Buena Energía de El Quimbo




3. Principales logros alcanzados

Por el canal regional Nación TV, dirigido a públicos de interés de carácter regional y local, comunidad en general. Se emitieron tres comunicados de prensa a través de medios de comunicación regionales, página web del proyecto dirigido a la comunidad en general y se llevó a cabo la distribución de ejemplares del periódico La Buena Energía de El Quimbo.

4. Indicadores

Población convocadas a diferentes eventos del Plan de Manejo Ambiental Vs. Población Asistente - Mes de Julio de 2015



Análisis de indicador:

Durante julio se logró un índice de participación superior a 100% de la población convocada a los diferentes eventos del plan de manejo ambiental, donde participaron familias trasladadas y población receptora.

Consulta y Concertación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante julio se llevaron a cabo dos sesiones del comité de reasentamiento con la comunidad de San José de Belén. En el primer comité de reasentamiento participaron 21 personas de las 16 convocadas y en el segundo participaron 30 personas de 16 familias. Los temas abordados durante los comités estuvieron relacionados con inquietudes de acuerdo respecto a compromisos en el reasentamiento.


Durante julio se llevó a cabo la concertación con la comunidad de San José de Belén para la ubicación de dos grutas como parte de los compromisos de reposición de la infraestructura física.



3. Principales logros alcanzados

Con los Comités de Reasentamiento, donde se destaca la alta participación de la comunidad y sus líderes, un logro a resaltar de este tipo de espacios es la forma como estos se vienen configurando como oportunidades de reflexión y apropiación del territorio por parte de la comunidad, donde se empiezan a establecer acciones prioritarias en busca del bienestar común.

4. Indicadores

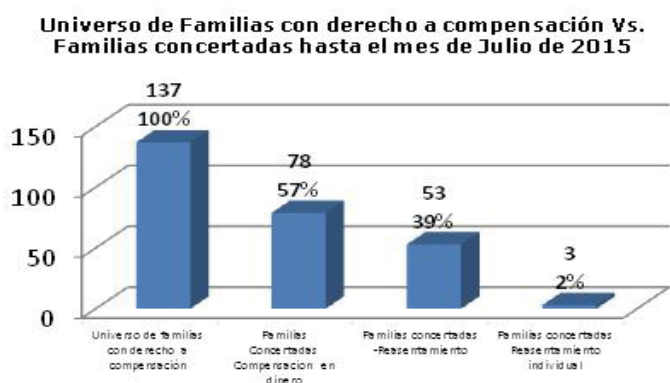

Análisis de indicador:

Durante julio se logró tramitar y dar respuesta a 100% de peticiones quejas y reclamos recepcionados a través de la oficina de atención a la comunidad. 90% de atenciones se realizaron a través de la gestión social del proyecto y 10 % corresponden a atenciones jurídicas.

Acompañamiento y asesoría

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas


En la etapa de post traslado se llevaron a cabo nueve visitas psicosociales, nueve actividades colectivas y cinco gestiones de acompañamiento. Una capacitación con cuatro mujeres en gestión y planeación, fortaleciendo el proceso de consolidación para la organización y liderazgo. Un taller de acomodación, aculturación e hibridación, logrando el reconocimiento de sus herramientas y estrategias adaptativas, hecho que les hizo tomar conciencia de la importancia de asumir los cambios como oportunidades de crecimiento personal en favor de sus proyectos de vida. En coordinación con el área económica de Socya se adelantó una capacitación en economía familiar, cultura del ahorro y fortalecimiento del rol como administradores. Esta tuvo la participación activa de 19 miembros de la comunidad.



3. Principales logros alcanzados

En lo que respecta a la comunidad de San José de Belén reasentada en La Galda, se evidenció en la etapa de postraslado la respuesta positiva de la comunidad a la convocatoria para las diferentes actividades. En ese aspecto, se ejecutaron nueve acciones colectivas en articulación entre las distintas áreas del operador social, buscando una intervención integral y transdisciplinaria en el proceso de acompañamiento.

4. Indicadores

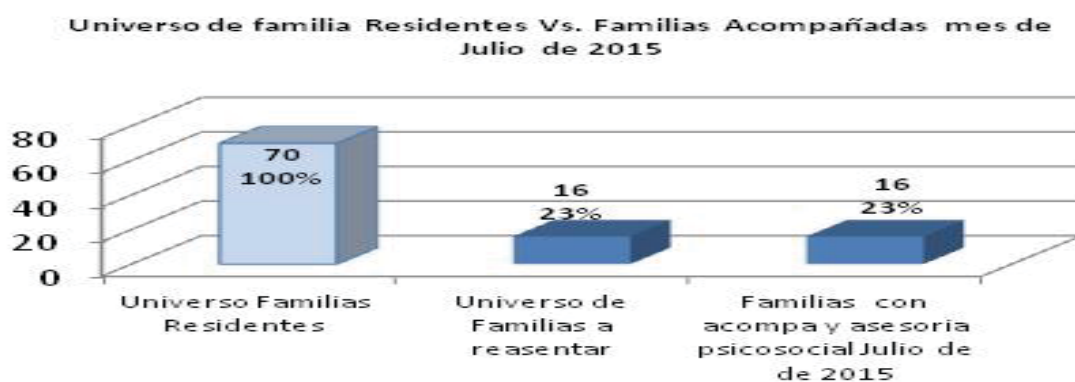

Análisis de indicador:

De las 70 familias residentes en San José de Belén, 32 tenía derecho a una medida de compensación, de las cuales 16 optaron por el reasentamiento colectivo, encontrándose a la fecha 100% de este universo trasladado al reasentamiento en La Galda.

Restablecimiento Tejido Social

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante julio se realizaron los siguientes eventos en el marco del proyecto de restablecimiento del Tejido social: Se realizó una capacitación a líderes de la comunidad de San José de Belén trasladada a la Galda. También se realizó la actividad “El baúl por mis abuelos”, los comités de ornato y un mini-comité de reasentamiento con niños, niñas y jóvenes de la comunidad. Con 11 niños, niñas y jóvenes de San José de Belén se realizaron dos sesiones de mini-comité para el reasentamiento, donde fueron capacitados en organización, participación y trabajo en equipo, logrando su reconocimiento como actores claves en el desarrollo y progreso de su territorio. En el reasentamiento de La Galda, la comunidad de San José de Belén recibió en la etapa de pos-traslado capacitaciones en “Liderazgo”, con la asistencia de 11 personas; en “Economía familiar”, con la participación de 19 miembros de la comunidad.




3. Principales logros alcanzados

En el proceso de capacitación a líderes se llevó a cabo el taller multipropósito para la comunidad de San José de Belén, donde se pretendió motivar a la organización y participación comunitaria. Otro de los fines fue la realización de la cartografía social como ejercicio de visión de comunidad y de diagnóstico, y finalmente se esperaba realizar el Índice de Capacidad Organizativa (ICO).

4. Indicadores

Talleres Programados Vs Talleres ejecutados Programa de restablecimiento del Tejido social Julio de 2015

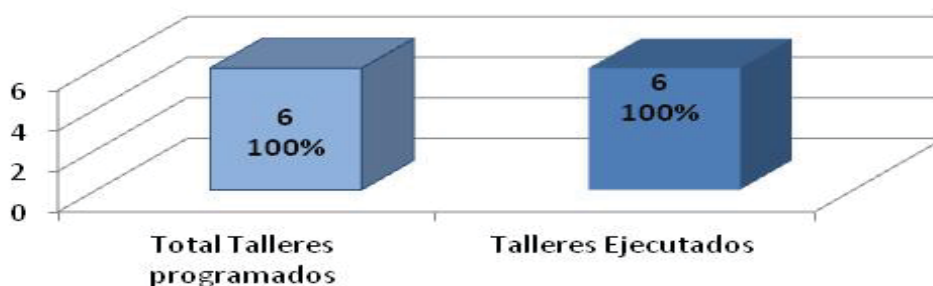

Análisis de indicador:

Durante julio se logró continuar con la ejecución del plan de capacitación dirigido a familias trasladadas e involucrando población receptora. Una de las actividades relevantes fue el “Festival por mis ancestros” del cual se concluye que es importante mantener viva la identidad local para que las nuevas generaciones la apropien y construyan sobre ella nuevas identidades que conserven todo lo que a nivel comunitario fortalece el tejido social.

Salubridad y Saneamiento

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se llevaron a cabo tres eventos en el marco del programa de salubridad y saneamiento básico con autoridades municipales y policía, las cuales contaron con la participación de 25 personas. Una de las actividades fue la de socializar la estrategia de respuesta para accidentes ofídicos y zoonóticos en el marco del llenado del embalse del PHEQ al Consejo Municipal de la Gestión del Riego y Desastres Municipales.

Un segundo evento fue la concetación de las líneas de emergencia y red de apoyo para la canalización de información y atención de emergencias para la estrategia de respuesta para accidentes ofídicos y zoonóticos durante el llenado del embalse del PHEQ. El tercer evento fue la capacitación en Manejo de hábitats y prevención de accidentes con fauna silvestre




3. Principales logros alcanzados

Con la Gobernación del Huila se llevó a cabo la socialización de ajustes y asesoría técnica de la estrategia de respuesta para accidentes ofídicos y zoonóticos durante el llenado del embalse del PHEQ. Por otra parte, se logró una participación total de 43 asistentes, de los cuales 18 eran de El Agrado, a la jornada de educación y vacunación, en el reasentamiento colectivo La Galda.

4. Indicadores

No. de Talleres Programados Vs No. de talleres ejecutados en el marco del Programa de salubridad y saneamiento básico Julio de 2015



Análisis de indicador:

Con la capacitación en el manejo adecuado de agroquímicos, en especial en la vereda La Cañada se logró la autorreflexión de los participantes, en la importancia de adoptar medidas preventivas ante la posibilidad de presentar intoxicaciones. De igual manera, se desarrolló el tema del manejo adecuado y disposición final de los residuos de agroquímicos, como medida preventiva de las intoxicaciones por exposición inherente a su labor agrícola.

emgesa

Garzón

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y Participación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante el período se llevaron a cabo procesos de información personalizada a las familias de los reasentamientos colectivos e individuales.

Para la población receptora de Brisas de Majo y de la Jagua se brindó información y se realizaron actividades colectivas para que estén informados de las obras que realiza Emgesa.

Además, en la oficina de Garzón se atendieron a las familias que lo requirieron en temas de censo y aprovechamiento forestal.

Foto: Visita de verificación de la obras de reposición de las lagunas de la Jagua con la Juanta Administradora del Acueducto - JAC y la comunidad. Municipio de Garzón. Julio 22 de 2015.




3. Principales logros alcanzados

Las familias reasentadas han sido informadas de los avances en la construcción del distrito de riego y los arreglos de la infraestructura comunitaria. Las familias receptoras del sector Brisas y la Jagua conocen el estado de las obras.

4. Indicadores

Información a comunidad receptora sector Brisas de Majo

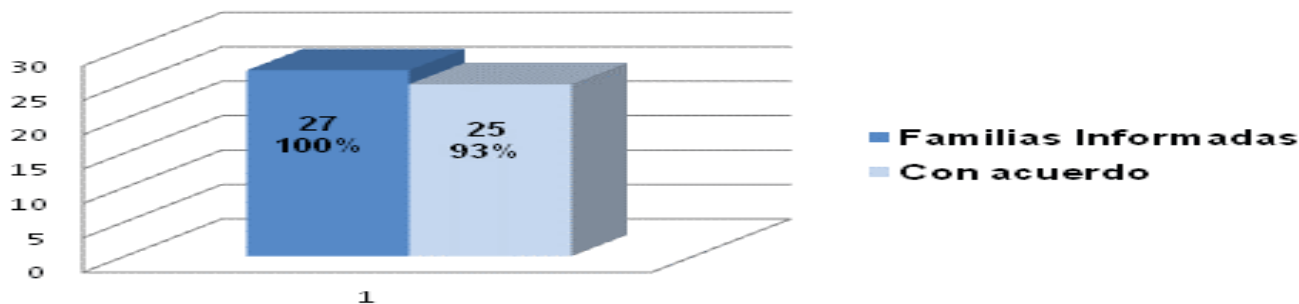

Análisis de indicador:

100% de las familias receptoras del sector Brisas de Majo conocen las obras y han firmado actas de acuerdo para la ejecución de las obras.

Consulta y Concertación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante el período no se presentó variación en este aspecto, siendo que 100% de las familias con derecho de compensación que no presentaban problemas jurídicos ya fueron concertados y reasentados, y los predios requeridos por el PHEQ han sido entregados en su totalidad.

Con las familias del reasentamiento colectivo de Santiago y Palacio se avanza en las concertaciones para la entrega de las obras comunitarias donde se socializó el acta de entrega de la vivienda de la finca.

Foto: Socialización del acta para entrega y recibo de la vivienda existente en Santiago y Palacio. Garzón, Julio de 2015.



3. Principales logros alcanzados

A la fecha se encuentran cuatro familias en expropiación ya que presentaban problemas jurídicos para acceder a las medidas de compensación establecidas en la Licencia Ambiental, los procesos avanzan en los términos de ley y cuentan con el respectivo acompañamiento social en las diligencias.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

100% de las familias que no tenían problemas jurídicos están concertadas y reasentadas. Con 5% de las familias que tenían problemas jurídicos no fue posible llegar a firma de acta de concertación y los predios se llevaron a entrega anticipada (expropiación). En el municipio de Garzón se logró 95,65% de familias concertadas y 100% de los predios están disponibles.

Acompañamiento y Asesoría

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante julio se realizaron 25 acciones de acompañamiento a las familias reasentadas en el municipio de Garzón, las cuales corresponden a:

- 13 visitas domiciliarias
- 10 actividades colectivas
- 2 gestiones.

Con estas acciones de acompañamiento participaron 23 familias, de las cuales 14 son del reasentamiento colectivo de Santiago y Palacio, una e se le asignó parcela y ocho más que optaron por reasentamiento individual

Foto: Acompañamiento psicosocial para preparación y adaptación al nuevo entorno: Video foro La Comunidad que queremos. Municipio de Garzón Julio 08 de 2015.



3. Principales logros alcanzados

Se atendió a 100% de las familias reasentadas en el municipio de Garzón (de manera colectiva e individual), trabajando temas de interés general y brindando apoyo individual a situaciones coyunturales de la dinámica familiar, que se han manifestado con ocasión del reasentamiento, y que pretenden el mejoramiento de su calidad de vida.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Se brindó atención psicosocial a 100% de las familias reasentadas en el municipio de Garzón, de las cuales 24 corresponden a familias de Santiago y Palacio y 11 a reasentamientos individuales: uno de Garzón y diez provenientes de otros municipios.

Restablecimiento del Tejido Social

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante el mes se continuó con las actividades colectivas y la organización de la población reasentada. Se realizó reunión con Asojuntas de Garzón para capacitaciones sobre la Ley 743 de 2002. Se realizó con apoyo de INCODER una asamblea para la elección de directivos y aprobación de estatutos de conformación de la Asociación de usuarios del Distrito de Riego.

Dos reuniones del Comité de Reasentamiento con participación de representantes de 16 familias con vivienda y nueve con parcela, y con el representante de Procuraduría.

Foto: Comité de Reasentamiento Santiago y Palacio. 30 de Julio de 2015.



3. Principales logros alcanzados

Se avanzó en la capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones sociales en el reasentamiento. Se tiene una organización que va a permitir la conformación y consolidación de la asociación de usuarios del distrito de riego en el reasentamiento de Santiago y Palacio.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Durante el período se programaron cuatro actividades comunitarias para el fortalecimiento del tejido social y la organización de las familias reasentadas, las cuales se desarrollaron en 100% y se obtuvieron los resultados esperados.

emgesa

Gigante

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y Divulgación

1. Identificación

Aspecto: Social

Período: Julio

Lugar: Gigante

Programa: Información y participación

Plan: Manejo Ambiental

Proyecto: Información, promoción y divulgación

2. Actividades relevantes realizadas

En julio se llevaron a cabo dos sesiones del comité de reasentamiento con la comunidad de Nuevo Veracruz, contando con la participación de 100% de las familias reasentadas.

También se realizó visita a la Alcaldía municipal con el fin de rendir informe sobre el avance en el proceso de liquidación de la Junta de Acción Comunal y la conformación de la nueva organización. Se realizó reunión con los directivos de la antigua junta con el objetivo de preparar el informe para la rendición de cuentas.


“En la Asamblea realizada el 11 de julio, que tuvo una asistencia de 65%, acordaron en pleno disolver la Junta de Acción Comunal. Por último, se realizó un taller en administración, operación y mantenimiento de zonas comunes en el comité de reasentamiento, con la participación de 20 personas.



3. Principales logros alcanzados

Emisión de información de interés para las personas a través de medios de comunicación (radio, prensa, televisión, página web) Participación de 100% de los convocados a los comités de reasentamiento celebrados.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

La ejecución de las actividades programadas en julio alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 100% en donde se mantiene una participación de 100% de los convocados al comité de reasentamiento.

Consulta y Concertación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

El 05 de julio se realiza el traslado de la señora Ángela Trujillo por solicitud expresa de ella misma, completando así el reasentamiento de las familias que optaron por materializar su medida de compensación en Montea, hoy día Reasentamiento Nuevo Veracruz.

De esta manera, 100% de las familias que optaron por el reasentamiento colectivo se encuentran en sus nuevos sitios de asentamiento.

En julio se mantiene un porcentaje de 97% de las concertaciones que corresponden a población del municipio de Gigante, de acuerdo a las compensaciones establecidas en la Licencia Ambiental. 3% restante corresponde a procesos de expropiación, que ya surtieron la etapa de entrega anticipada.



3. Principales logros alcanzados

100% de las familias reasentadas en Montea, hoy Reasentamiento Nuevo Veracruz.

4. Indicadores

Gráfico 1. Avance en Proceso de Concertación Julio 2015


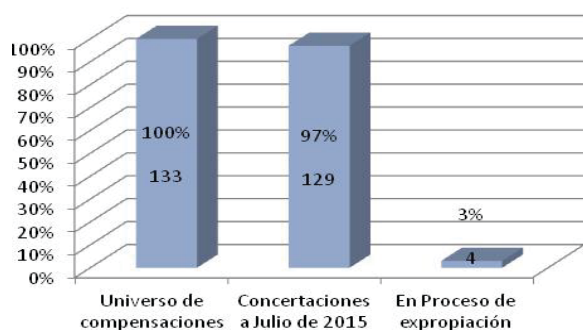


Gráfico 2. Familias de Reasentamiento Colectivo municipio de Gigante Julio de 2015

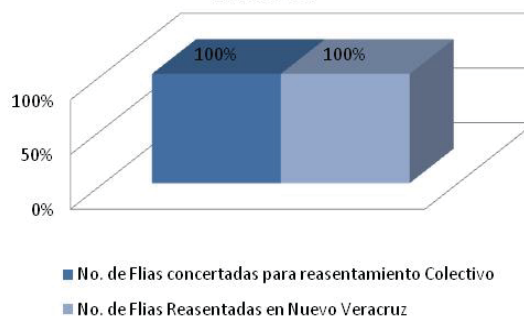

Análisis de indicador:

El gráfico 1 muestra que para el municipio de Gigante se alcanzaron 97% de concertaciones y solo 3% se encuentra en proceso de expropiación.

El gráfico 2 muestra que 100% de las familias están habitando el reasentamiento Nuevo Veracruz.

Acompañamiento y Asesorías

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

En el municipio de Gigante se llevaron a cabo un total de 38 acciones de acompañamiento a 15 familias ubicadas en el reasentamiento de Montea y 11 de compensación en dinero. De estas, 28 correspondieron a visitas domiciliarias, siete a la realización de actividades colectivas y tres de gestión.

Ya como parte de la etapa de pos-traslado, se desarrolló la actividad lúdico recreativa “Al derecho y al revés” donde participaron 70 niños, niñas y jóvenes de las familias reasentadas y del centro poblado de Rioloro con quienes se trabajó el tema de derechos y deberes. También se realizó el taller de “Autocuidado” con 13 niños y niñas, donde lograron identificar las acciones que ponen en riesgo su integridad física, bienestar y relaciones familiares/sociales. Además, se desarrolló un taller de “Cartografía Social”, con asistencia de 13 personas de Rioloro. De igual manera, se convocó reunión del Comité de Ornato en el cual se concretó el plan de acción y la programación de la jornada de aseo como muestra de apropiación al nuevo entorno.




3. Principales logros alcanzados

En el proceso de implementación de acciones colectivas, se realizaron las sesiones de cierre de las terapias de grupo, espacios que lograron posicionarse como escenarios de participación con un efecto terapéutico enfocado a dos sectores poblacionales (adultos mayores y jóvenes).

4. Indicadores

Gráfico No. 1
Acciones de Acompañamiento Municipio de Gigante - Julio 2015



Análisis de indicador:

Durante julio se realizaron un total de 38 acciones de acompañamiento, de las cuales 74% fueron visitas domiciliarias, 8% de gestión para el acceso a servicios y 18% actividades colectivas.

Restablecimiento del Tejido Social

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

En julio se desarrolló la “Jornada de integración con juegos tradicionales por el reconocimiento de los derechos y deberes de niños, niñas, jóvenes” que tuvo lugar en el reasentamiento de Montea con la participación de 70 niñas, niños y jóvenes de la comunidad de Nuevo Veracruz, y de la comunidad receptora de Rioloro. Se contó con el apoyo de la Defensa Civil y la Alcaldía Municipal de Gigante. El desarrollo de las jornadas incluyó pintacaritas, aeróbicos, partido de microfútbol por relevos, juegos tradicionales (lazo, carrera de encostados, caballitos).

FECHA: 18/07/2015

LUGAR: Reasentamiento Nuevo Veracruz - Montea, centro poblado Rioloro, municipio de Gigante



3. Principales logros alcanzados

Con los temas abordados se logró contextualizar a la comunidad, quienes reconocieron las funciones de los directivos de la asociación así como los elementos básicos de Ley que profieren los estatutos,. También resolvieron inquietudes respecto a su distrito de riego y fueron motivados a participar de los procesos de capacitación técnica del SENA en riego, que están próximos a comenzar.

4. Indicadores

Grafico 1. Actividades de Restablecimiento del Tejido Social Julio - de 2015



Análisis de indicador:

El gráfico muestra 100% de ejecución de las actividades programadas para julio en el programa de restablecimiento del tejido social.

Atención a Población Vulnerable

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se realizaron acciones para desarrollar la autonomía y el empoderamiento, a fin de que se puedan generar ingresos y mejores oportunidades para las mujeres cabeza de hogar y sus familias. En el componente de asistencia técnica se realizó entrega de insumos y se verificó el cumplimiento de las recomendaciones dadas para fertilizar las plantas a dos mujeres cabeza de hogar.

Una mujer cabeza de familia del reasentamiento Nuevo Veracruz se vinculó en las capacitaciones de cacao y junto con su hija asisten al curso “gallinas ponedoras” realizado por el SENA.




3. Principales logros alcanzados

Fortalecimiento de las unidades productivas de la población vulnerable para su participación en las acciones de integración social y su adaptación al nuevo entorno en sus lugares de reasentamiento.

4. Indicadores

Gráfico 1. Universo de población vulnerable vs Población atendida durante Julio de 2015

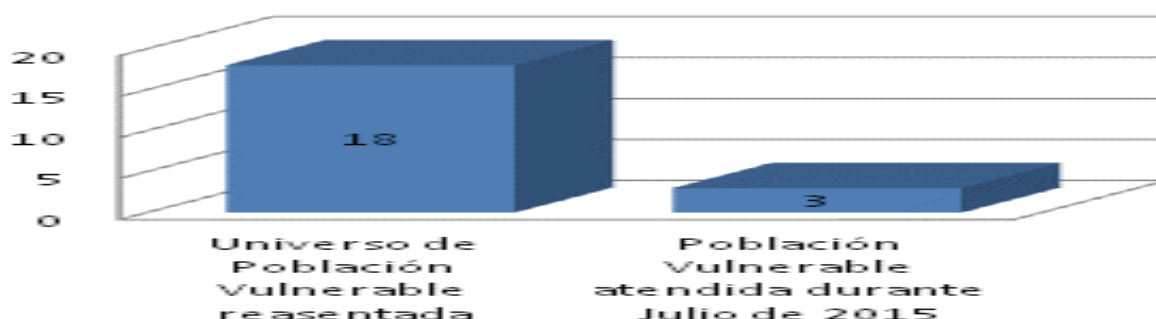

Análisis de indicador:

La gráfica muestra que durante julio se atendió a 17% de la población vulnerable que ya ha sido reasentada, representado en tres mujeres cabeza de hogar.

emgesa

Autoridades Empleo

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información, Promoción y Divulgación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se participó en reuniones con presidentes de Junta de Acción Comunal de las veredas del AID del PHEQ; se proyectó la revisión y actualización de la base de datos de empleo con el fin de contar con personal disponible para los cargos solicitados por los contratistas. De igual manera, se atendieron inquietudes de los presidentes relacionados con los contratistas del PHEQ.


Foto: Capacitación MON, mayo de 2015. Convenio SENA-Emgesa. Relacionado con el Comité de Empleo, se presentaron los resultados de la contratación de personal para junio de 2015, también se presentaron resultados de los servicios y compras del mismo mes. Se logró así un importante avance en el cumplimiento de los porcentajes de contratación establecidos por la Licencia Ambiental.



3. Principales logros alcanzados

En junio de 2015 se puede evidenciar que la distribución en la contratación se encuentra así: 1649 personas son MONC, de las cuales 1465 corresponden a los municipios y veredas del AID. Esto corresponde a un 88,9%, con el cual se da cumplimiento al porcentaje establecido por Licencia Ambiental en el que nos establece la vinculación de 80% de la MONC.

4. Indicadores

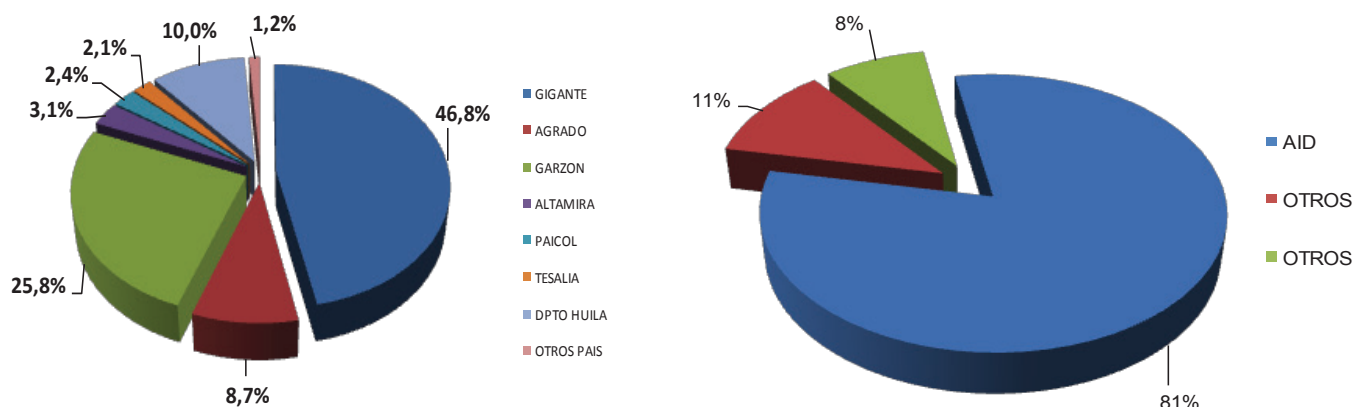

Análisis de indicador:

Del total de asistentes la mitad realizó intervención y registró su pregunta, inquietud o sugerencia.
